[Kick-off] 내부 개발 포털 - 커스텀 관리도구

📝 **히스토리**

날짜	내용	작성자
2026년 3월 3일	draft v.0.1.	@서상은/mena
2026년 3월 4일	준케이 싱크업 보완 draft v.0.2. • 내부 개발 포털 추가하여 재구성	@서상은/mena

🎯 **요약**

프로젝트/지라	TBD
타겟일정	3월 중순
채널	TBD
담당자	• 기획/개발: @서상은/mena w/ @김준기/준케이 • Devops: @박정훈/이안 @홍재무/핀
산출물	• 디자인: TBD • test resource: TBD

🤯 아래 내용은 논의를 위한 초안이며, 세부 내용과 범위는 논의를 통해 수정될 수 있습니다.🤯

---

1. 프로젝트 개요

이번 프로젝트는 내부 개발 포털(Inhouse Dev Portal)을 처음 구축하는 파일럿이자,
그 안에서 DevOps 반복 작업을 도구로 치환하는 첫 번째 기능(커스텀 빌드 관리도구) 를 만들고자 합니다.

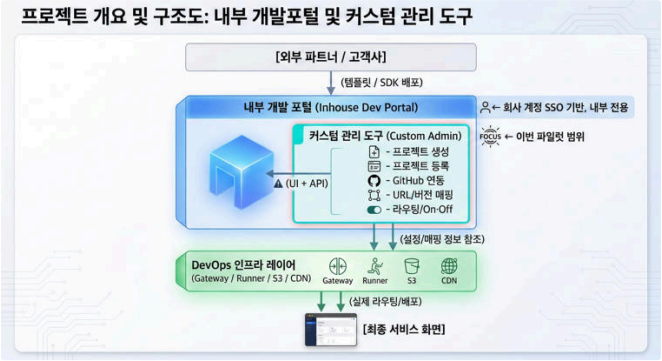

장기적으로는 외부파트너 / 단기적으로는 박애런만 접근 가능하도록 계획

1.1. 내부 개발 포털이란?

정의	• 데브옵스가 운영중인 여러 워크플로우를 한 곳으로 모으는 내부용 포털 • 커스텀 관리도구 외에도, 다른 인프라/운영 도구들이 **같은 포털 안에 모이는 구조**
목적	• **업무 가시성 확보:** 지금까지는 사람의 손으로 처리되던 작업들(예: 라우팅 매핑, S3 설정 변경, Kill Switch 등)을 **도구(UI + API)** 로 끄집어냄 • **운영 안정성 확보:** 업무의 설정·매핑·버전·상태를 한 화면에서 가시화하고, 변경이력과 버전 관리로 운영 리스크 감소 • → 단기적으로는, 현재 **커스텀 운영이 수기로 진행되고 있는 현상을 개선시키며,** 장기적으로는, 이외에도 **데브옵스에서 수기로 하던 업무를 내부 개발 포털로 가시화**하는 것입니다.
권한 및 보안	• 초기 단계: ◦ **회사 계정 SSO 기반의 내부 전용 포털**로 제한합니다. ◦ 권한은 거의 **Flat(동일 권한)** 구조로 운영해도 되는 수준의 범위/대상으로 시작합니다. ◦ User별 보이는 메뉴, 역할 등 • 이후 단계: ◦ 포털에 더 많은 기능과 팀이 들어올 수 있으므로, **역할 기반 권한(RBAC)**을 점진적으로 확장

인프라 레이어	어떻게 동작시킬지를 논의 필요

커스텀 관리도구 기능 흐름도 v1

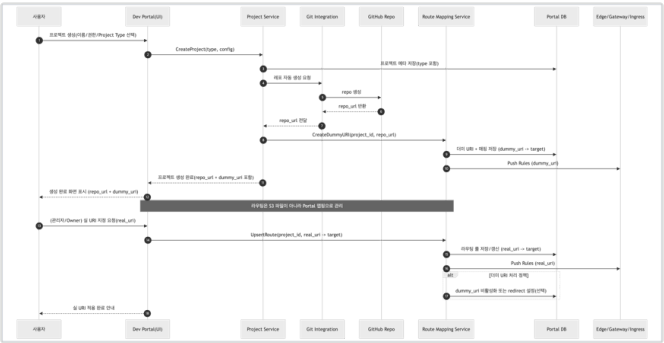

1.2. 커스텀 관리 도구란?

정의	• 커스텀 페이지를 등록할 수 있는 프로젝트를 생성·관리하고, 그 프로젝트와 **실제 서비스 라우팅(URI 매핑)을 연결**해 주는 박애런용 내부 슈퍼 어드민 • 내부 개발 포털 안에서 제공되는 **여러 어드민 모듈 중 하나.** • 참고) 커스텀 도메인 생성과 관련한 기능은 별도 기능이며, 커스텀 페이지관련한 셋팅관련한 내용만으로 한정한다.
주요 기능	• **프로젝트 생성** ◦ 프로젝트 타입: 커스텀, 검색.. 등 ◦ 커스텀 프로젝트일때 타입: ▪ **Full Page(풀 페이지)** – 전체 페이지 단위 퍼블리싱 • 템플릿 유형 선택: a. Liquid 형식 개발 완료 - 이번 프로젝트 3월 타겟 b. SDK(Web Component) 형식 개발 완료, 보안 진행 - 추후 프로젝... ▪ **In-page(인페이지)** *준케이 작명, 바뀔수있음 – 기존 페이지의 특정 영역(Placeholder)에 컴포넌트 삽입 진행중 ▪ **API 연동** – bstage Gateway를 통해 외부에서도 토큰 기반으로 API 호출하는 형태 진행중 • **커스텀 리소스 등록 및 구동** TO-BE  ◦ 1) 프로젝트 등록 시 **GitHub 레포지토리가 자동 생성 - 우선 user쪽에 안보임** ▪ 레포 이름 시스템 발번 ◦ 2) 레포지토리에 커스텀 리소스 푸시 ▪ 시용자는 배포상태 확인가능 ◦ 3) Git 태그(Tag)를 활용해 **버전 관리**를 수행 • **라우팅 기능** ◦ 라우팅 맵은 “현재 이 경로는 어느 레포의 어느 태그(버전) 를 바라본다” 같은 참조 정보를 가짐 ◦ 레파지토리 : URI = 1:1 로 일단 정하고, 추후 1:N는 고도화

- 

  - 포털 내 매핑 화면에서 해당 프로젝트/버전을 특정 URI/경로와 연결하면,
  - DevOps 인프라 레이어(게이트웨이, S3/CDN 등)가 이 매핑 정보를 참조하여 실제 라우팅을 수행하는 구조를 목표로 합니다.
- → 이 구조를 통해, 기존에 **S3 파일을 직접 수정하며 관리하던 Route 매핑**을 이제는 **포털 내에서 데이터 모델 + UI 기반으로 관리**할 수 있게 됩니다.

1.3. 커스텀 관리도구 계획안

1.3.1. 현재 커스텀 운영방식 (AS-IS)

1. **커스텀 템플릿(현재는 Liquid 중심)**
   - 외부 파트너/고객사가 `template.liquid` + `data.json` 조합으로 템플릿을 개발
   - GitHub에 Push → Runner가 빌드 → S3/CDN에 업로드 (상세: [Liquid 템플릿 가이드])

2. **3rd-Party CI/CD 플로우**
   - 외주사 개발자가 GitHub에 코드를 올리면
   - GitHub Actions + Runner가 S3에 배포, CDN으로 노출
   - 현재까지의 파이프라인 정리: [아카이브] 3rd-Party개발자의 CI/CD플로우(AIgen)

3. **사람이 수기로 하던 '매핑' 작업 (Devops)**
   - 예: `www.회사.com/event` → `S3/CDN 상의 커스텀 파일 경로` 를
     - 내부 개발자가 설정 파일/코드를 **직접 수정**해서 매핑
   - 문제점
     - 개발자 의존, 오타 리스크, 변경 요청시 응답 속도 저하
     - 데브옵스 팀에 반복적인 업무 부담

1.3.2. 목표 운영방식 (TO-BE)

1. **비개발자도 GUI로 매핑/제어할 수 있는 '커스텀 빌드 관리도구' 제공**
   - 핵심 기능 가안이며, 논의후 확정할 예정입니다
     - URL 매핑 (`/2026-promo` 등) + 진입점 설정 (메인 덮어쓰기, GNB 메뉴 추가 등)
     - On/Off 토글, 디바이스별 GNB 노출 제어
     - 타임존 기반 On/Off 예약
     - 실시간 미리보기(Sandbox)
     - RBAC + Audit Log
   - 참고) 기존 기획서 from 커스텀 스쿼드
     - [P1/CONSOLE] 커스텀 빌드 관리 도구
     - [초기기획] 커스텀 빌드 관리도구

2. **Liquid → Web Component(커스텀 SDK)로의 전환 예정이므로, 추후 영향 반영 필요**
   - 지금까지: `template.liquid` + `data.json` = 종이 편지지
   - 앞으로: `manifest.json` + JS 번들(Web Component 패키지) = 스마트 키오스크 앱
   - 영향:
     - 매핑 대상이 "파일 1개"가 아니라 **패키지 (vendor/templateName, version)** 단위
     - 브라우저 컨텍스트 공유 → 보안/안정성 관점에서 **Kill Switch 최우선**
     - 실제 데이터(stageData)와 연동된 **샌드박스 미리보기 환경 필요**
   - 참고: b.stage SDK 문서
     - b.stage SDK 개요

🤝 협업 포인트

PM인 mena가 “과제 구조화/진행 관리”를 맡고, DevOps 팀이 “운영 관점의 최소 조건·제약사항 + 우선순위”를 제시하면서, 서로의 빈 곳을 채워가는 형태의 협업을 목표로 합니다.

☁️ DevOps 팀에서의 니즈 (추측)

아래 내용은 DevOps 팀과의 사전 교류가 많지 않은 상태에서, 이번 프로젝트를 준비하며 제가 추측한 내용입니다. 킥오프 미팅에서 실제 상황과 맞는지, 무엇을 더/덜 해야 하는지 함께 조정하고 싶습니다.

1. 이미 많은 운영·보안 관련 과제가 동시에 진행되어, 그 중에서 어떤 항목을 먼저 도구화/가시화하는 것이 필요할 수 있음
2. open ecosystem 기조 하에서, 외부 파트너·고객사와 연계될 때 “DevOps 팀이 어디까지 책임지고, 어디부터는 툴/프로세스로 넘길지”에 대한 기준이 필요할 수 있음

✏️ mena (비개발자) 측에서의 니즈

저는 PM 출신, 비개발자이며, 이번 프로젝트에서

- **AI 기반 개발 툴(Antigravity 등)을 사용해 실제 웹 페이지 UI를 구현**해야 하는 역할입니다.
- 프로젝트를 작게 쪼개고, 단계별 목표를 정리하고, 우선순위를 합의하는 일에는 익숙하지만 개발/인프라 전문가가 아니기 때문에, DevOps 관점에서 “어디까지가 최소로 지켜야 할 선인지”를 혼자서 정확히 판단하긴 어렵습니다.
- 그래서 이번 프로젝트에서 제가 가장 필요로 하는 건 DevOps 관점에서 반드시 지켜야 할 최소 조건·제약사항/보안을 초기에 명확히 합의하는 것입니다.

---

2. 프로젝트 타임라인

3월 중 보안에 최대한 결격사유가 없는 형태로, liquid.js에 대한 레포지토리 생성 및 라우팅 자동화를 구축합니다.

빠르게 Quick win 하기 위하여 주단위 진행을 계획했으며, 논의하여 변경가능합니다.

2.1. 프로젝트 타임라인

- 1. 메나가 **3/6,7 화면 구성/기능 리스트- 콜할 내용 정리 → 과제 가시화**
- 2. devops
  - 작업이 돌기위한 필요 정보들 devops가 먼저 정리 (이 페이지 하단으로) → 메나가 필요한 기능정의에 참조
  - web component관련 devops x custom 확인 세션 필요
  - 이 프로젝트 통한 KPI 흐름도 정리하여 발표때 ~ 사용~할수있도록 잡아보기
- → 차주에 싱크업 세션하여 계획수립
- 3. 보안관련해서는 과제 가시화되면 따로 미팅 셋업.

기간	~3/6	3/7~ (1주)	3/17~ (1주)	3/24~ (1주)	3말
단계	1 킥오프 & 스펙 정리	2 도메인/데이터 모델 설계	3 관리도구 1차 구현	5 QA/REAL 계획 & 운영 리허설	6 1차 릴리즈 & 모니터링
목표	• UI단의 필요한 스펙 정리 • 내부 개발 포털 1차 모듈(커스텀 관리도구)”의 **역할 범위**와 **DevOps 반복업무 중 1차로 도구화할 항목**을 합의 • DevOps가 포털에 기대하는 **운영·보안 기준(최소 가이드)** 확인	설계 전 확인해야하는 내용 크로스 체크 및 산출물 생산 및 보안 인터뷰(시큐어 코딩 가이드 like github pr)	AI 기반으로 **관리도구 UI 1차 구현** • 클로드코드	REAL 환경과 연동하기 위한 **보안·인프라 체크리스트** 정리	REAL 환경에 **MVP 수준으로 관리도구 오픈**
메나	• 킥오프 진행 • 필요 스펙 인터뷰 w/ 커스텀, 비즈 • 커스텀 관리도구 상위 기획 ◦ 관리도구 mvp 기능 정리	• DevOps 인터뷰를 바탕으로, **도메인/데이터 모델 초안** 작성 • 비개발자용 플로우 기준으로 **콘솔 화면 플로우** 설계	• AI **UI 1차 버전 구현** (프로토타입 수준 OK) • DevOps가 제공하는 Mock/DEV API 스펙에 맞춰 **프론트 연동**	• 보안 정책 pass를 위한 검토 요청 • DevOps에서 제공한 REAL 연동 요구	• 데모세션 • 초기 사용자(내부/제한된 고객사)의 피드백 수집

	◦ 관리도구 UI 플로우 정의	• DevOps가 합의한 메타데이터 기준을 반영해 API 요청/응답 예시를 정리	• UX 보정 포인트 논의	사항/제약을 문서로 정리 • 운영 가이드 작성	• 사용성 이슈/개선점 정리하여 차기 우선순위 리스트 정리
Devops	• 현재 수기로 처리 중인 DevOps 업무를 **항목화 + 우선순위 분류** ("반드시 이번 파일럿에서 자동화해야 하는 것" vs "2단계 이상으로 미룰 수 있는 것") • 내부 개발 포털이 참조해야 할 **기본 인프라 구조/제약** 공유 (ex. S3/CDN/게이트웨이 레이어 개요 등..)	• 관리도구/포털이 참고해야 할 **메타데이터 모델 정의** • 동적 라우팅·Kill Switch를 어느 레벨(게이트웨이/서비스/CDN)에서 처리할지 1차 결정하고, 그에 맞는 **API/구조 초안** 정리 • 관리도구에서 사용할 **Mock API/Swagger 스펙** 초안 제공 (읽기/쓰기, 인증 방식 포함)	• DEV 환경에 **Mock 또는 실제 일부 인프라 연결** • 관리도구 UI와 DEV 인프라 간 end-to-end 흐름을 함께 점검	• REAL 환경에 연결할 때 필요한 **보안 검토/리스크 체크리스트** 정리 • 장애/보안 이슈 발생 시 사용할 상위 Kill Switch/롤백/차단 레이어 정의 • REAL 연결 단계에서 필요한 추가 모니터링/로그 수집 포인트 정의	• REAL 환경에 MVP 수준 기능 연결/오픈 • 운영 중 발생하는 장애/경고 로그를 모니터링하고, 툴 도입 전/후 작업량 비교 등 레퍼런스 케이스 정리

---

5. DevOps 팀과 먼저 확인해야하는 사항

킥오프 미팅에서 DevOps 팀과 합의/결정(or 옵션 정리)하고 싶은 주제들입니다.
특히, 저는 AI 툴로 구현할 때, DevOps 관점에서 반드시 지켜야 할 보안 및 기술적 제약이나 가이드(프레임워크, 배포 방식 등)에 대한 내용을 확인하고 싶습니다. 어떤 내용이 must이고 어떤건 나중에 가능할지 확인하고 싶습니다.

	구분	질문	응답
1		커스텀의 범위가 넓어서, devops 내 고려 범위 • app으로 띄우면, docker, 등등 요구사항 등을 리스트업 필요 • liquid만 생각하면, 포탈에서는 task급 일듯, • → 요구사항에 따	
2	**깃헙 레파지토리 자동생성**	• AS-IS는 깃헙에 코드를 포크 뜬 후 수동으로 진행(?)하신다고 들었습니다. • TO-BE로는 어드민에서 처리 > 깃헙 레포 생성 > 초대 > 깃헙에 외부 파트너만 들어와서 코드를 푸시 > 라우팅 되도록하려고하는데, 외부 <> 내부 통신간 지켜야하는 보안 규칙이 있을지? 궁금합니다.	
3	**권한 모델**	• 내부 BMF 관리자를 위한 내부 어드민으로 구축하는 것으로 알고 있습니다. (추후에는 고객사에 제공할 뷰가 필요하더라도) • 이를 위해 처리할 보안 정책이 있다면 사항을 공유해주시면 좋을 것 같습니다. • 우선, 로그인은 내부 인원만 가능하도록 구글 회사계정 로그인등으로 제한하는 방법이나 특정 인원에게만 접근권한을 부여하는 방식 생각하고 있고, • 향후 n개의 기능이 내부 포탈에 존재하게 될 경우는 각 필요에 따라 권한 모델을 설계/구현하는 것으로 생각됩니다.	

		• DevOps 팀이 필요한 권한: ◦ 강제 차단, 강제 롤백, 설정 Lock 등	
4	**현재 3rd-Party CI/CD 파이프라인 재점검**	• GitHub → Runner → S3/CDN 흐름 재확인 ◦ 문서 기준으로만 확인한 바로는 위와 같은데, 현재 구현된 방식과 동일한 것인지 확인하고자 합니다. • 현재 3rd-Party CI/CD 플로우에서 “손을 거의 안 대고 재사용할 수 있는 부분” vs “이번에 손봐야 하는 부분”은 어디까지인지 • 커스텀 빌드 관리도구가 접근/참조해야 할 **S3 경로/메타데이터 규칙** 이 궁금합니다.	

5	**보안- 롤백 전략**	• 오류 난 버전을 끄는 것 외에
		  ◦ 이전 안정 버전으로 **원클릭 롤백**이 가능한지
		• 3월 런칭 시점에는
		  ◦ 단순 On/Off만 먼저 지원할지,
		  ◦ 최소 1단계 롤백까지 포함할지 논의
		• 버전 관리(패키지 v1, v2...)
		• 히스토리	

6	**Audit Log 요구사항 정리**	오딧 로그 관련해서 미리 알아야하는 부분들이 뭐가 있는지? • “누가, 언제, 어떤 URL/패키지 설정을 어떻게 변경했는지” • DevOps에서 모니터링/장애 분석에 실제로 필요한 필드 정의	
7	**환경별 (DEV/QA/REAL) 구조와 네이밍 규칙**	각 환경별로 어떻게 서비스할지 정해가면 좋을 것 같습니다. • 각 환경별 S3 버킷, CDN 도메인/경로 구조 • 관리도구에서 환경을 선택했을 때 ◦ 실제로 어떤 엔드포인트/S3 경로를 바라보게 할지	

8	**Kill Switch(긴급 정지) 구현 전략**	• 관리도구에서 On/Off 토글하는 것 외에:
		  ◦ DevOps 관점의 상위 레벨 차단 레이어 필요 여부 (예: WAF, 라우터 레벨, Feature Flag)
		• 장애/보안 이슈 발생 시
		  ◦ **누가, 어느 레벨에서, 몇 초 안에** 어떤 버튼/플로우로 끌 수 있는지	

9	**캐시 및 배포 반영 타이밍**	캐시 관련한 셋팅은 나중에 결정하면 되는지
		• On/Off, 매핑 변경, 버전 변경 시:
		  ◦ CDN 캐시 무효화 전략 (전역/부분, TTL, API 연동 필요 여부)
		• “3월 중~말 런칭” 기준으로
		  ◦ **최소 구현 가능한 캐시 인발리데이션 플로우** 정의	

10	**동적 라우팅 판단 로직 위치**	동적 라우팅 & Kill Switch를 어느 레벨(서비스, 게이트웨이, CDN 등)에 두는 것이 DevOps 입장에서 가장 안전/효율적인가요?	

기타..		

appendix. 참고문서

문서명	링크
Liquid 템플릿 가이드	https://github.com/partners-bmf/bstage-partners-templates/blob/main/LIQUID_GUIDE.md Github 계정 연결
3rd-Party CI/CD(AIgen)	[아카이브] 3rd-Party개발자의 CI/CD플로우(AIgen)
b.stage SDK	b.stage SDK 개요
커스텀 빌드 관리도구 기존 자료	• [P1/CONSOLE] 커스텀 빌드 관리 도구 • [초기기획] 커스텀 빌드 관리도구
